



Planificación entrega instrumentos definitivos Calendario Norte ERCE 2019

**Lorena Meckes
MIDE UC**




Antecedentes y consideraciones relevantes

- A diferencia de la entrega de los instrumentos piloto, la entrega de los instrumentos definitivos requiere del **análisis de los resultados de la aplicación piloto**.
- Este proceso no necesita adaptaciones idiomáticas, pero sí la elaboración de un **nuevo ensamblaje** con los ítems que cumplieron las exigencias psicométricas según el plan de análisis.
- Para ERCE, y según recomendación de CTAN (Washington, 2018), para las pruebas de logro se deberá incrementar el número de bloques ancla, utilizando los dos bloques comunes que se consideraban originalmente, más un bloque adicional que puede ser un bloque intacto, o compuesto por ítems provenientes de distintos bloques (bloque sintético). Por este motivo, la propuesta de ensamblaje para la prueba definitiva considera **7 formas**, a diferencia de TERCE donde se aplicaron 6 formas.

Antecedentes y consideraciones relevantes

- Para los países que no participaron en el TERCE, este nuevo bloque debe pasar por un proceso de adaptaciones idiomáticas, previo al ensamblaje definitivo.
- El cronograma de ERCE considera plazos muy ajustados para análisis de los datos de la aplicación piloto, así como también para el ensamblaje y diagramación de los instrumentos.
- Es de máxima importancia el cumplimiento de las fechas para la entrega de las bases de datos por parte de los países.

Procesos involucrados en la elaboración de los instrumentos definitivos

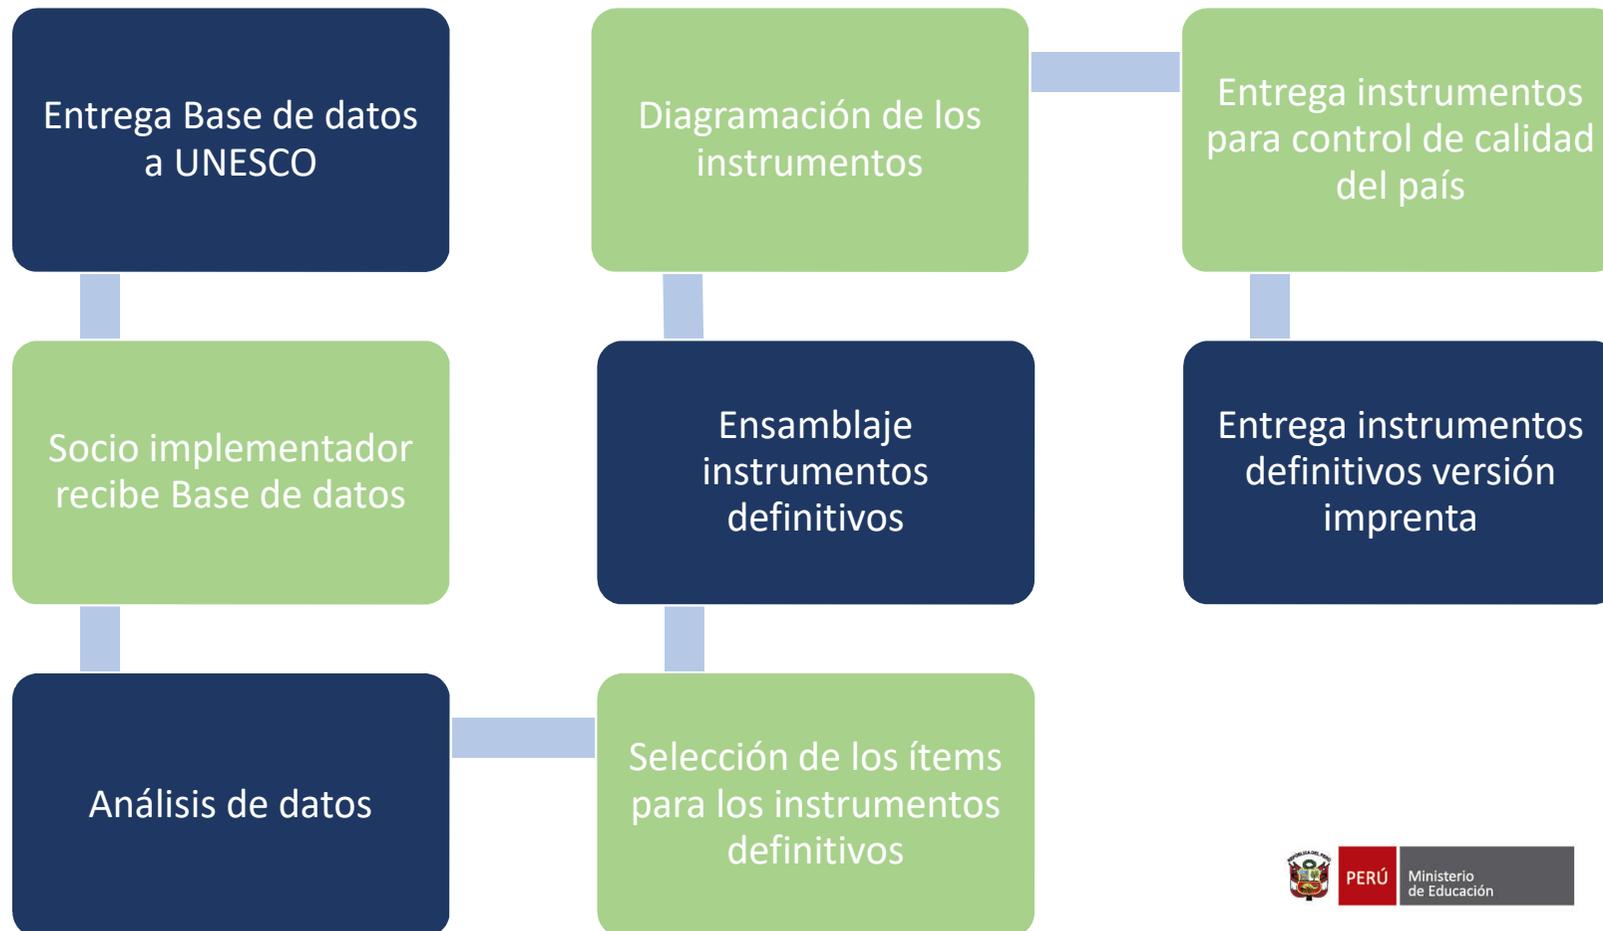

Planificación de trabajo para el desarrollo de los instrumentos definitivos

Principales hitos de trabajo que contempla la fase de análisis y ensamblaje de los instrumentos definitivos para Pruebas de Logro y Cuestionarios de Factores Asociados.

Procesos	2018				2018				2019				2018				2019			
	Novbre				Dicbre				Enero				Febrero				Marzo			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Adaptaciones idiomáticas Bolivia, Cuba y El Salvador (bloque ancla nuevo P.de logro)			■	■																
UNESCO entrega de Base de datos Fase 1 a Socio implementador			■																	
Análisis de datos piloto, Fase 1 y pre-selección ítemes				■	■	■	■	■												
UNESCO entrega de Base de datos, Fase 2 a Socio implementador									■											
Análisis de datos piloto, Fase 2									■	■	■	■								
Ensamblaje versión final PL y FA											■	■	■	■	■	■				
Diagramación de los instrumentos definitivos																	■	■		
Entrega a países calendario norte para control de calidad																			■	
Entrega instrumentos definitivos a países, versión imprenta																			■	■

Fechas entrega instrumentos definitivos países calendario norte

País	Fecha aplicación	Entrega instrumentos control de calidad	Devolución países control de calidad	Entrega instrumentos definitivos
Rep. Dominicana	13 al 15 de mayo	20 de marzo	25 de marzo	29 de marzo
Cuba	27 a 29 de mayo	18 de marzo	22 de marzo	26 de marzo
México	Junio	Desde 9 abril*	16 abril	23 de abril
Ecuador (norte)	3 al 5 de junio	9 abril	16 de abril	23 de abril

*Dependiendo de fecha de aplicación definitiva

Muchas gracias
